

..... 1–2

..... 3–10

..... 11–16

2024 8-326

开户银行	银行	号	募集资金	余额
上海浦东发展银行	支行	461007880005	40,283,	23.73
合计	大道支行		57,753,	90.66

三、本年募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况

(二) 募集资金投资项目

(三) 募集资金投资项目

(四) 募集资金投资项目

(五) 募集资金投资项目

(六) 募集资金投资项目

(七) 募集资金投资项目

四、变更募集资金用途情况

(一) 变更募集资金用途

(二) 变更募集资金用途

(三) 变更募集资金用途

(四) 变更募集资金用途

(五) 变更募集资金用途

(六) 变更募集资金用途

(七) 变更募集资金用途

(八) 变更募集资金用途

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 募集资金使用及披露中存在的问题

(二) 募集资金使用及披露中存在的问题

(三) 募集资金使用及披露中存在的问题

(四) 募集资金使用及披露中存在的问题

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

(六) 募集资金使用及披露中存在的问题

(七) 募集资金使用及披露中存在的问题

(八) 募集资金使用及披露中存在的问题

(九) 募集资金使用及披露中存在的问题

(十) 募集资金使用及披露中存在的问题

(十一) 募集资金使用及披露中存在的问题

(十二) 募集资金使用及披露中存在的问题



附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	179,081.27	本年度投入募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额											
		147,382.45											
项目	是否已变更项目	承诺投入总额	截至期末承诺投入总额	截至期末实际投入总额	截至期末累计投入总额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末累计投入金额占承诺投入金额的百分比	截至期末未投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本年度投入金额	是否发生调整	调整原因	
热带高效非胶农业项目	是	71,632.51	1,150.62	1,150.62	1,150.62		100.00	不适用	不适用	不适用	是	已调整	
更新种植项目	是	107,448.76	126,781.86	126,781.86	19,680.62	-95,093.04	-31,698.82	75.00	2033 年	不适用	不适用	是	已调整
永久补充流动资金	是		51,148.79	51,148.79	51,148.79		100.00	不适用	不适用	不适用	是	已调整	
合计	-	179,081.27	179,081.27	179,081.27	19,680.62	-31,698.82	-	-	-	-	-	-	



一、热带高效非胶农业项目未达计划进度原因

(一) 根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》《保护区划定工作的通知》（农计发〔2017〕99号）要求，海南省出台了《海南省水稻生产功能区和天然橡胶生产保护区划定工作方案》。公司以所属企业为主体，开展保护区划定工作。2019年底，天然橡胶生产保护区划定工作完成。2020年，海南省各市县政府按照划定协议与各自辖区企业签订《责任书》，明确规定天然橡胶保护区内发展其他橡胶林上界外，橡胶保护区内不得

未达计划进度原因

(二) 海南加大生态环境整治，规范林业用地。根据国家环保督查情况，2018年3月，海南

(一) 近年来，根据国家及海南省政府

发展战略，进一步聚焦主业、发展天然橡胶产业，逐步调减非胶种植计划，特别是香蕉、凤梨等草本植物的种植计划。


二、特种胶园更新种植项目未达进度原因

橡胶园更新种植项目未达进度原因：2018年3月，海南省政府加大了生态环境整治力度，出于生态保护

放园的更新受到林业政策限制，只能小面积实施人工作业，无法规模化更新和种植；另外，受林业政策影响，部分基地的胶园实行采伐指标的限制，即年度指标超限，需停止采伐。受上述客观原因限制，公司特种胶更新种植进度延缓。



	<p>综合考虑国家产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局及本次募投项目公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>70,491.90万元</p> <p>同时为促进公司主业可持续健康发展，公司决定在2021-2025年继续实施特种胶园更新种植项目，并对原特种胶园更新种植项目的建设规模、抚管规模及投资计划进行适当调整，即在2016-2020年完成胶园更新种植21.82万亩的基础上，2021-2025年继续种植更新胶园5年，其中，71,788.56万元使用募集资金，3,326.35万元使用公司自有资金。方案计划使用的募集资金71,788.56万元中52,455.46万元拟使用原特种胶园更新种植项目募集资金，19,333.10万元使用热带高效非胶农业项目终止后的剩余募集资金。</p> <p>《海南橡胶关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已于2021年8月2日和2021年8月10日经公司第五届董事会第四十次临时会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2018年9月21日召开第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，并于2018年9月27日召开2018年第三次临时股东大会审议通过。会计师事务所出具鉴证报告，项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2018）170002号），公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。综上，公司个别任债供券仅项目先期投入的情况。</p>



公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《海南橡胶关于

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专户。
日，公司使用 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未到期。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后、已投入项目募集资金总额及以前年度已投入金额。

最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件 2

亦雨董佳迄今拟投资项目情况表

2023 年度

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 截至期末计划	本年度	实际累计投	计划进度(%)	项目达到	本年度	是否达到	变更后的项目
目	目	投入金额	投入金额	入金额	入金额	(%)	(%)	(%)	名称
热带高效开发	热带高效	1,150.62	1,150.62	1,150.62	100.00	不适用	不适用	不适用	否
热带雨林更新	热带雨林	196,791.96	196,791.96	196,791.96	100.00	不适用	不适用	不适用	否
资金	胶农业项目	51,149.70	51,149.70	51,149.70	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		179,981.27	179,981.27	179,981.27	147,982.45				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）


详见附件 1

未达到计划进度的情况和原因

详见附件 1

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

详见附件 1

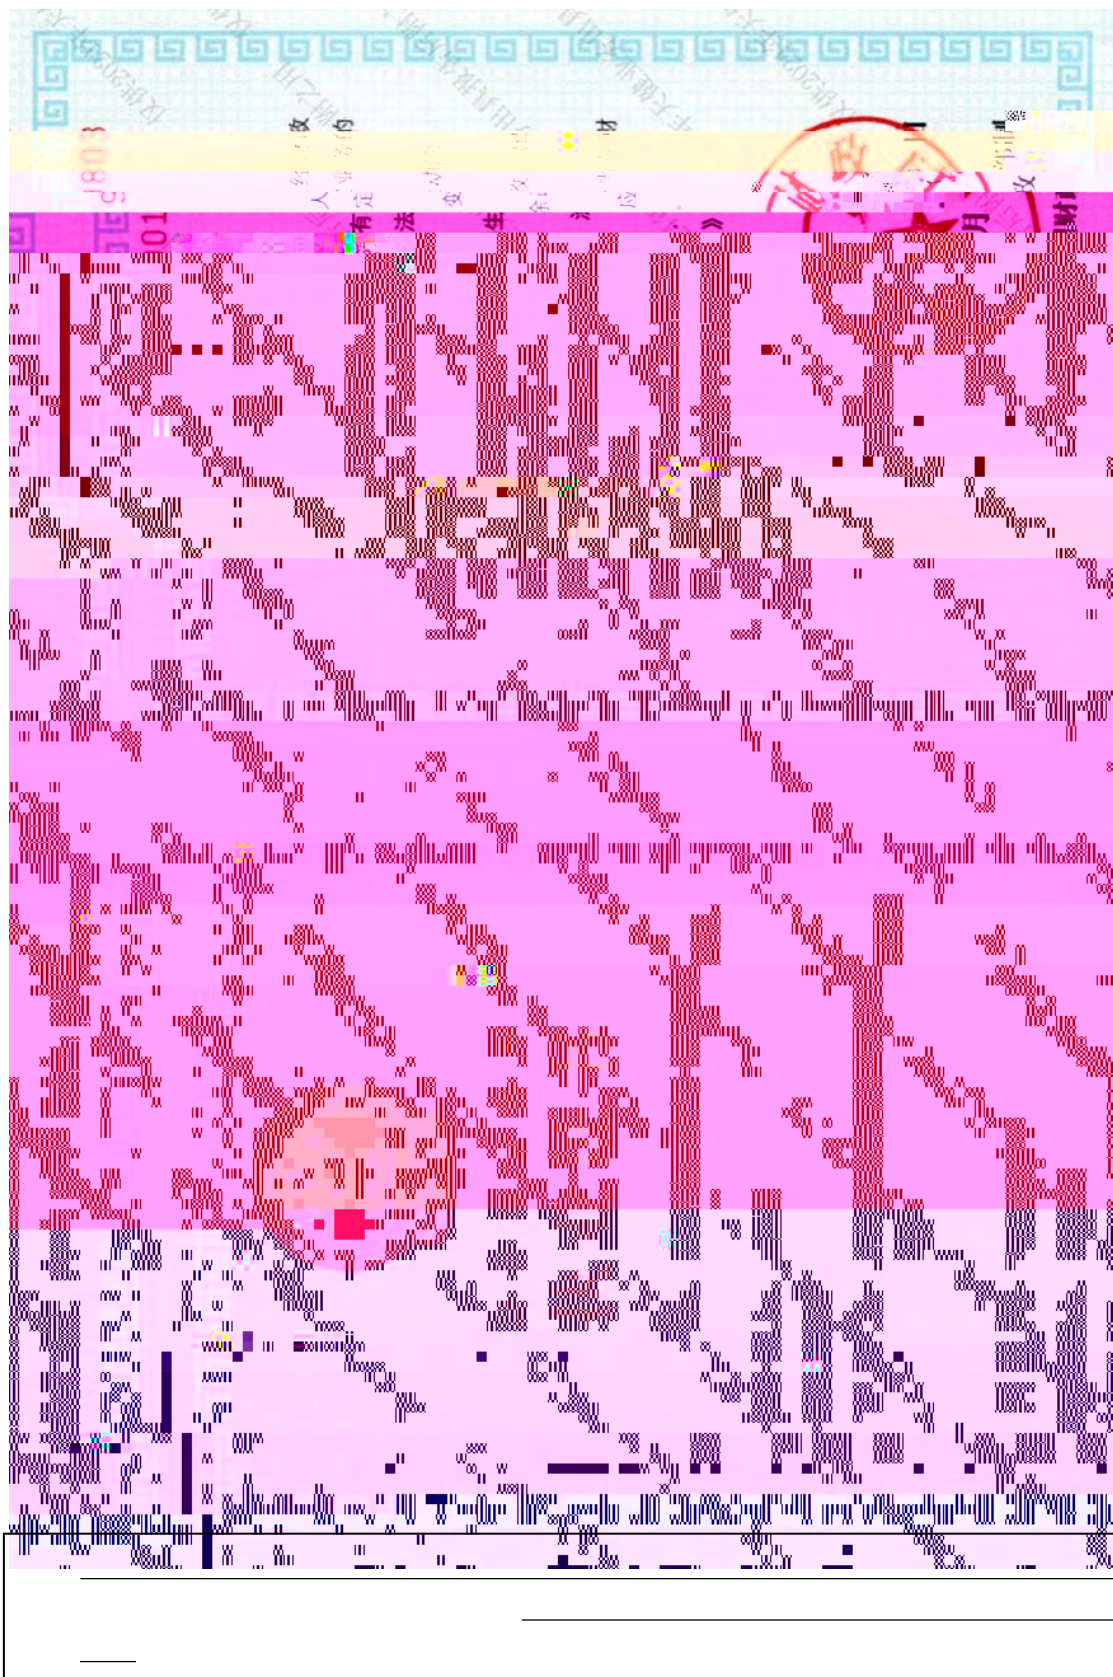




CPA PUBLIC ACCOUNTANTS



2017年09月02日

天健会计师事务所


113670902125



Faint text and lines, possibly a signature or address area




CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名: 王佳音
 性别: 女
 身份证号: 330102198505020022
 工作单位: 浙江天健会计师事务所有限公司
 注册会计师编号: 330102011917

姓名: 王佳音
 性别: 女
 身份证号: 330102198505020022
 工作单位: 浙江天健会计师事务所有限公司
 注册会计师编号: 330102011917



Lt &



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000011917
 No. of Certificate

批准注册: 浙江天健会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 5 月 2 日
 Date of Issuance y m d

2013 年 3 月 31 日
 y m d



